

Tout savoir sur les travaux !

#4

Juin 2021

# AMENAGEMENT DU POLE RESTAURATION

Chers Résidents, Visiteurs,


L'étape numéro 2 du chantier « gros œuvre et ravalement » est désormais bien avancée.

Les dernières semaines de travaux ont eu leurs lots de surprises !

La première a été au sujet de poteaux de soutien dans la salle de restauration. Le projet initial prévoyait de les conserver pour poser la nouvelle charpente. Il s'avère que l'analyse de la conception, des dits poteaux, montre une armature insuffisante pour recevoir la nouvelle construction. Un nouveau projet est à l'étude.

La seconde a été la découverte d'une ancienne cuve à fuel. Cette réserve devait alimenter la cuisine en énergie. Il a fallu étudier différentes options en fonction des contraintes techniques. La cuve a d'abord été vidée de son sable et dépolluée. Elle a ensuite été retirée. Le vide sera comblé par du remblais. Des pilotis en béton seront créés de façon à reposer la nouvelle chappe sur une base solide.

Ces nouveaux éléments pourraient décaler de quelques semaines la livraison du chantier.

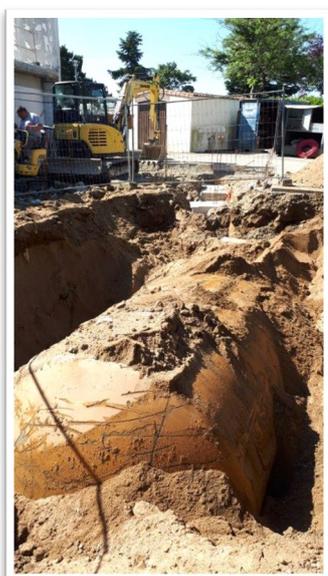

Tout savoir sur les travaux !

# Album photos



Vue intérieur salle à manger



Fondations futur extension



Fondations futur ascenseur.



- Elevation sous sols et plancher
- Elévation rdc
- Charpente bois et murs ossatures bois
- Couverture zinc , bardage zinc et descentes EP intérieures
- Inauguration du nouveau pôle de restauration

